

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN
RAKYAT PROVINSI JAMBI
BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN BULANAN
PERIODE 1 – PERIODE 4**

**SUB KEGIATAN :
PEMBANGUNAN JALAN**

**PAKET PEKERJAAN :
JALAN SIMP. MARGOYOSO - SUMBER AGUNG - AIR HITAM/SIMP.
MENTAWAK (DBH SAWIT)**

**NOMOR KONTRAK
TANGGAL KONTRAK
ADDENDUM-01
SUMBER DANA
PENYEDIA JASA
KONSULTAN**

**: T-600.2.10.2_15/JLN/DPUPR-5.2/VI/2025
: 24 JUNI 2025
: 19 AGUSTUS 2025
: DBH SAWIT PROVINSI JAMBI
: CV. NIRWANA TIRTA ABADI
: PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI**

LAPORAN BULANAN

Paket Pekerjaan : Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak (DBH Sawit)
 Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Merangin
 No. Kontrak : T-600.2.10.2.15/JLN/DPUPR-S.2/VI/2025
 Tanggal Kontrak : 24 Juni 2024
 Addendum-01 : 19 Agustus 2024
 Konsultan Supervisi : PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI
 Penyedia Jasa : CV. NIRWANA TIRTA ABADI

Bulan : September 2025
 Periode : 01 September 2025 s/d 30 September 2025

NO. ITEM PEMBAAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK				KEMAJUAN PEKERJAAN					% TERHADAP	
			KONTRAK AWAL		BOBOT (%)		S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	ITEM PEKERJAAN	SELURUH PEKERJAAN
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME		
DIVISI 1	SUMUM												
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	0,689		0,70	0,482	-	-	0,70	70,00	0,482
SKh-1.1.22.1(a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, ROPPL dan RMLLP	Set	1,00	1,00	0,012		1,00	0,012	-	-	1,00	100,00	0,012
SKh-1.1.22.1(b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	1,00	0,012		1,00	0,012	-	-	1,00	100,00	0,012
SKh-1.1.22.1(c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMK	Set	1,00	1,00	0,012		-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22.2(a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	25,00	25,00	0,006		25,00	0,006	-	-	25,00	100,00	0,006
SKh-1.1.22.2(b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	20,00	20,00	0,002		20,00	0,002	-	-	20,00	100,00	0,002
SKh-1.1.22.2(c)	Spanduk (Banner)	Buah	4,00	4,00	0,005		4,00	0,005	-	-	4,00	100,00	0,005
SKh-1.1.22.2(d)	Poster / Leaflet	Lembar	4,00	4,00	0,005		4,00	0,005	-	-	4,00	100,00	0,005
SKh-1.1.22.2(e)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Lembar	2,00	2,00	0,009		2,00	0,009	-	-	2,00	100,00	0,009
SKh-1.1.22.2(f)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	20,00	20,00	0,011		20,00	0,011	-	-	20,00	100,00	0,011
SKh-1.1.22.2(g)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	4,00	4,00	0,001		4,00	0,001	-	-	4,00	100,00	0,001
SKh-1.1.22.2(h)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Buah	50,00	50,00	0,002		50,00	0,002	-	-	50,00	100,00	0,002
SKh-1.1.22.2(i)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	20,00	20,00	0,008		20,00	0,008	-	-	20,00	100,00	0,008
SKh-1.1.22.2(j)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	20,00	20,00	0,027		20,00	0,027	-	-	20,00	100,00	0,027
SKh-1.1.22.2(k)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	20,00	20,00	0,021		20,00	0,021	-	-	20,00	100,00	0,021
SKh-1.1.22.2(l)	Asuransi (Construction All Risk / CAR)	LS	1,00	1,00	0,901		1,00	0,901	-	-	1,00	100,00	0,901
SKh-1.1.22.2(m)	Pelugan PJK	Orang	5,00	5,00	0,156		4,00	0,125	-	-	4,00	80,00	0,125
SKh-1.1.22.2(n)	Pelugan pengatur lalu lintas	Orang	8,00	8,00	0,249		4,00	0,125	2,00	0,062	6,00	75,00	0,187
SKh-1.1.22.2(o)	Peralatan PJK	Set	5,00	5,00	0,030		5,00	0,030	-	-	5,00	100,00	0,030
SKh-1.1.22.2(p)	Rambu petunjuk	Buah	4,00	4,00	0,007		4,00	0,007	-	-	4,00	100,00	0,007
SKh-1.1.22.2(q)	Rambu larangan	Buah	4,00	4,00	0,007		4,00	0,007	-	-	4,00	100,00	0,007
SKh-1.1.22.2(r)	Rambu peringatan	Buah	2,00	2,00	0,004		2,00	0,004	-	-	2,00	100,00	0,004
SKh-1.1.22.2(s)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	12,00	12,00	0,021		12,00	0,021	-	-	12,00	100,00	0,021
SKh-1.1.22.2(t)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,00	2,00	0,001		2,00	0,001	-	-	2,00	100,00	0,001
SKh-1.1.22.2(u)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	1,00	0,011		1,00	0,011	-	-	1,00	100,00	0,011
SKh-1.1.22.2(v)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	5,00	5,00	0,000		5,00	0,000	-	-	5,00	100,00	0,000
DIVISI 2	DRAINASE												
2.1.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	182,00	134,36	0,081		134,36	0,081	-	-	134,36	100,00	0,081
2.2.1	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	81,00	78,20	0,905		-	-	-	-	-	-	-
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.2.2(a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	1.833,50	1.381,05	3,478		150,00	0,378	-	-	150,00	10,86	0,378
3.3.1	Penyiapan Badan Jalan	M2	6.750,00	10.543,50	0,422		10.543,50	0,422	-	-	10.543,50	100,00	0,422
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.410,00	1.395,90	15,580		1.395,90	15,580	-	-	1.395,90	100,00	15,580
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.057,50	1.136,02	11,728		1.136,02	11,728	-	-	1.136,02	100,00	11,728
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL												
6.1.1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	4.050,00	6.489,45	2,265		1.083,00	0,378	5.406,45	1,887	6.489,45	100,00	2,265
6.1.2(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	2.025,00	2.004,76	0,704		-	-	1.939,82	0,681	1.939,82	96,75	0,681
6.3.5(a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	618,84	606,68	14,471		-	-	584,84	13,950	584,84	96,40	13,950
6.3.5(b)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	931,50	911,64	21,242		-	-	905,95	21,110	905,95	98,38	21,110
6.3.7(a)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	Ton	1.164,38	1.167,95	26,316		-	-	1.164,52	26,239	1.164,52	99,71	26,239
6.3.8	Bahan anti pengelupasan	Kg	88,18	84,94	0,160		-	-	81,88	0,154	81,88	96,40	0,154
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN												
9.2.1	Marka Jalan Termoplastik	M2	247,50	149,88	0,439		-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BOBOT					100,0		REALISASI %	30,401	REALISASI %	84,683	REALISASI %	94,485	
							RENCANA %	6,756	RENCANA %	37,281	RENCANA %	46,836	
							DEVIASI %	21,646	DEVIASI %	28,802	DEVIASI %	48,448	

Diperiksa/Ditandatangani oleh,
 PPK Bidang Rina Marga Sub Kegiatan Pembangunan Jalan

Wahyu Hidayat, ST
 NP. 19780821 2012 1001

Diperiksa oleh,
 Konsultan Supervisi
 PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI

Supervision Engineer

Diajukan oleh,
 Penyedia Jasa
 CV. NIRWANA TIRTA ABADI

Eka Prayitno, ST
 Pelaksana Proyek


LAPORAN BULANAN

Paket Pekerjaan : Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak (DBH Sawit)
 Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Merangin
 No. Kontrak : T-606.2.10.2_15/JLN/DPUPR-5.2/VI/2025
 Tanggal Kontrak : 24 Juni 2024
 Addendum-01 : 19 Agustus 2024
 Konsultan Supervisi : PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI
 Penyedia Jasa : CV. NIRWANA TIRTA ABADI


Bulan : Agustus 2025
 Periode : 01 Agustus 2025 s/d 31 Agustus 2025

NO. ITEM PEMBATARAN	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK			KEMAJUAN PEKERJAAN					% TERHADAP	
			KONTRAK AWAL	ADD-01	BOBOT (%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI		S/D BULAN INI	ITEM PEKERJAAN	SELURUH PEKERJAAN	
						VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME		
DIVISI 1	UMUM											
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	0,689	0,70	0,482	-	-	0,70	70,00	0,482
SKh-1.1.22 (1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKDPL dan RMLLP	Set	1,00	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	100,00	0,012
SKh-1.1.22 (1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	100,00	0,012
SKh-1.1.22 (1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMK	Set	1,00	1,00	0,012	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	25,00	25,00	0,006	25,00	0,006	-	-	25,00	100,00	0,006
SKh-1.1.22 (2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	20,00	20,00	0,002	20,00	0,002	-	-	20,00	100,00	0,002
SKh-1.1.22 (2c)	Spanduk (Banner)	Buah	4,00	4,00	0,005	-	-	4,00	0,005	4,00	100,00	0,005
SKh-1.1.22 (2d)	Poster / Leaflet	Lembar	4,00	4,00	0,005	4,00	0,005	-	-	4,00	100,00	0,005
SKh-1.1.22 (2e)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Lembar	2,00	2,00	0,009	2,00	0,009	-	-	2,00	100,00	0,009
SKh-1.1.22 (3a1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	20,00	20,00	0,011	-	-	20,00	0,011	20,00	100,00	0,011
SKh-1.1.22 (3a2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	4,00	4,00	0,001	-	-	4,00	0,001	4,00	100,00	0,001
SKh-1.1.22 (3a3)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Buah	50,00	50,00	0,002	-	-	50,00	0,002	50,00	100,00	0,002
SKh-1.1.22 (3a4)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	20,00	20,00	0,008	-	-	20,00	0,008	20,00	100,00	0,008
SKh-1.1.22 (3a5)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	20,00	20,00	0,027	-	-	20,00	0,027	20,00	100,00	0,027
SKh-1.1.22 (3a6)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	20,00	20,00	0,021	-	-	20,00	0,021	20,00	100,00	0,021
SKh-1.1.22 (4a)	Asuransi (Construction All Risk / CAR)	LS	1,00	1,00	0,901	-	-	1,00	0,901	1,00	100,00	0,901
SKh-1.1.22 (5)	Petugas P3K	Orang	5,00	5,00	0,156	2,00	0,082	2,00	0,082	4,00	80,00	0,125
SKh-1.1.22 (5a)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	8,00	8,00	0,249	-	-	4,00	0,125	4,00	50,00	0,125
SKh-1.1.22 (6a)	Peralatan P3K	Set	5,00	5,00	0,030	5,00	0,030	-	-	5,00	100,00	0,030
SKh-1.1.22 (7a)	Rambu petunjuk	Buah	4,00	4,00	0,007	4,00	0,007	-	-	4,00	100,00	0,007
SKh-1.1.22 (7b)	Rambu arahan	Buah	4,00	4,00	0,007	4,00	0,007	-	-	4,00	100,00	0,007
SKh-1.1.22 (7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	100,00	0,004
SKh-1.1.22 (7d)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	12,00	12,00	0,021	12,00	0,021	-	-	12,00	100,00	0,021
SKh-1.1.22 (7e)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,00	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	100,00	0,001
SKh-1.1.22 (8a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	100,00	0,011
SKh-1.1.22 (8a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	5,00	5,00	0,000	5,00	0,000	-	-	5,00	100,00	0,000
DIVISI 2	DRAINASE											
2.1 (1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	162,00	134,36	0,081	-	-	134,36	0,081	134,36	100,00	0,081
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	81,00	78,20	0,905	-	-	-	-	-	-	-
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK											
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	1.633,50	1.381,05	3,478	-	-	150,00	0,378	150,00	10,86	0,378
3.3 (1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	6.750,00	10.543,50	0,422	6.412,50	0,257	4.131,00	0,165	10.543,50	100,00	0,422
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN											
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.410,00	1.395,90	15,580	-	-	1.395,90	15,580	1.395,90	100,00	15,580
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.057,50	1.136,02	11,728	1.046,93	10,808	89,10	0,920	1.136,02	100,00	11,728
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL											
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	4.050,00	6.489,45	2,265	-	-	1.083,00	0,378	1.083,00	16,69	0,378
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	2.025,00	2.004,76	0,704	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	618,84	605,68	14,471	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5b)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	931,50	911,64	21,242	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.164,38	1.167,95	26,316	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	88,18	84,94	0,160	-	-	-	-	-	-	-
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN											
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	247,50	149,88	0,439	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BOBOT					100,0	REALISASI %	11,737	REALISASI %	18,665	REALISASI %	30,401	
						RENCANA %	1,868	RENCANA %	6,847	RENCANA %	8,755	
						DEVIASI %	9,829	DEVIASI %	11,618	DEVIASI %	21,646	


Diperiksa/Ditandatangani oleh,
 PPK Bidang Bina Marga Sub Kegiatan Pembangunan Jalan


 WAHYU HIDAYAT, ST
 NIP. 19780821 201212 1 001

Diperiksa oleh,
 Konsultan Supervisi
 PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI


 EKA PRAYITNO, ST
 Supervision Engineer

Diajukan oleh,
 Penyedia Jasa
 CV. NIRWANA TIRTA ABADI


 EKA PRAYITNO, ST
 Pelaksana Proyek

JALAN TAMP. MANCING - SUMBER AGUNG - AIR HITAM TAMP. MENTAMBAH (JH. SAKET)

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> at UNIV OF CALIF SAN DIEGO on May 12, 2015

1-800-233-2333 FAX 408-254-0228
2nd Jan 2016
1000 TARMOUNT DRIVE, FARMINGTON, CT 06030

[illegible]

A *Chaperone club,*
Auction Department
of the United States Mint

CV. SUPREMACI TIGA AGUNG
Purabaya, 14 Juli 2023
DIA PRATYONG, SE
Pembantu Presiden


LAPORAN BULANAN

Paket Pekerjaan : Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak (DBH Sawit)
 Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Merangin
 No. Kontrak : T-600.2.10.2_15/JLN/DPUPR-5.2/VI/2025
 Tanggal Kontrak : 24 Juni 2024
 Konsultan Supervisi : PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI
 Penyedia Jasa : CV. NIRWANA TIRTA ABADI

Bulan : Juli 2025
 Periode : 01 Juli 2025 s/d 31 Juli 2025

NO. ITEM PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						% TERHADAP	
					S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI			
			KONTRAK AWAL	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	ITEM PEKERJAAN	SELURUH PEKERJAAN
DIVISI 1	UMUM											
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	0,689	0,10	0,069	0,60	0,413	0,70	70,00	0,482	
SKh-1.1.22 (1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPP, dan RMLLP	Set	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	1,00	100,00	0,012	
SKh-1.1.22 (1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	1,00	100,00	0,012	
SKh-1.1.22 (1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMK	Set	1,00	0,012	-	-	-	-	-	-	-	
SKh-1.1.22 (2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	25,00	0,006	-	-	25,00	0,006	25,00	100,00	0,006	
SKh-1.1.22 (2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	20,00	0,002	-	-	20,00	0,002	20,00	100,00	0,002	
SKh-1.1.22 (2g)	Spanduk (Banner)	Buah	4,00	0,005	-	-	-	-	-	-	-	
SKh-1.1.22 (2h)	Poster / Leaflet	Lembar	4,00	0,005	-	-	4,00	0,005	4,00	100,00	0,005	
SKh-1.1.22 (2i)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Lembar	2,00	0,009	-	-	2,00	0,009	2,00	100,00	0,009	
SKh-1.1.22 (3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	20,00	0,011	-	-	-	-	-	-	-	
SKh-1.1.22 (3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	4,00	0,001	-	-	-	-	-	-	-	
SKh-1.1.22 (3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Buah	50,00	0,002	-	-	-	-	-	-	-	
SKh-1.1.22 (3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	20,00	0,008	-	-	-	-	-	-	-	
SKh-1.1.22 (3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	20,00	0,027	-	-	-	-	-	-	-	
SKh-1.1.22 (3b11)	Rompri keselamatan (Safety Vest)	Buah	20,00	0,021	-	-	-	-	-	-	-	
SKh-1.1.22 (4a)	Asuransi (Construction All Risk / CAR)	LS	1,00	0,901	-	-	-	-	-	-	-	
SKh-1.1.22 (5f)	Petugas P3K	Orang	5,00	0,156	-	-	2,00	0,062	2,00	40,00	0,062	
SKh-1.1.22 (5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	8,00	0,249	-	-	-	-	-	-	-	
SKh-1.1.22 (6a)	Peralatan P3K	Set	5,00	0,030	-	-	5,00	0,030	5,00	100,00	0,030	
SKh-1.1.22 (7a)	Rambu petunjuk	Buah	4,00	0,007	-	-	4,00	0,007	4,00	100,00	0,007	
SKh-1.1.22 (7b)	Rambu larangan	Buah	4,00	0,007	-	-	4,00	0,007	4,00	100,00	0,007	
SKh-1.1.22 (7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	2,00	100,00	0,004	
SKh-1.1.22 (7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	12,00	0,021	-	-	12,00	0,021	12,00	100,00	0,021	
SKh-1.1.22 (7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	2,00	100,00	0,001	
SKh-1.1.22 (9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	1,00	100,00	0,011	
SKh-1.1.22 (9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	5,00	0,000	-	-	5,00	0,000	5,00	100,00	0,000	
DIVISI 2	DRAINASE											
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	162,00	0,098	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	81,00	0,937	-	-	-	-	-	-	-	
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK											
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	1.633,50	4,113	-	-	-	-	-	-	-	
3.3 (1)	Penyisipan Badan Jalan	M2	6.750,00	0,270	-	-	6.412,50	0,257	6.412,50	95,00	0,257	
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN											
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.410,00	15,737	-	-	-	-	-	-	-	
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.057,50	10,917	-	-	1.046,93	10,808	1.046,93	99,00	10,808	
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL											
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	4.050,00	1,413	-	-	-	-	-	-	-	
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	2.025,00	0,711	-	-	-	-	-	-	-	
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	618,84	14,761	-	-	-	-	-	-	-	
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	931,50	21,705	-	-	-	-	-	-	-	
6.3 (7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.164,38	26,236	-	-	-	-	-	-	-	
6.3 (8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	88,18	0,166	-	-	-	-	-	-	-	
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN											
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	247,50	0,725	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH BOBOT				100,0	REALISASI %	0,069	REALISASI %	11,668	REALISASI %		11,737	
					RENCANA %	0,060	RENCANA %	1,847	RENCANA %		1,908	
					DEVIASI %	0,009	DEVIASI %	9,820	DEVIASI %		9,829	


Diperiksa/Ditetujui oleh,
 PPK Bidang Bina Marga Sub Kegiatan Pembangunan Jalan


 WAHYU HIDAYAT, ST
 NIP. 19780821 200212 1 001

Diperiksa oleh,
 Konsultan Supervisi
 PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI


 EKA PRAYITNO, ST
 Supervisor Engineer

Diajukan oleh,
 Penyedia Jasa
 CV. NIRWANA TIRTA ABADI

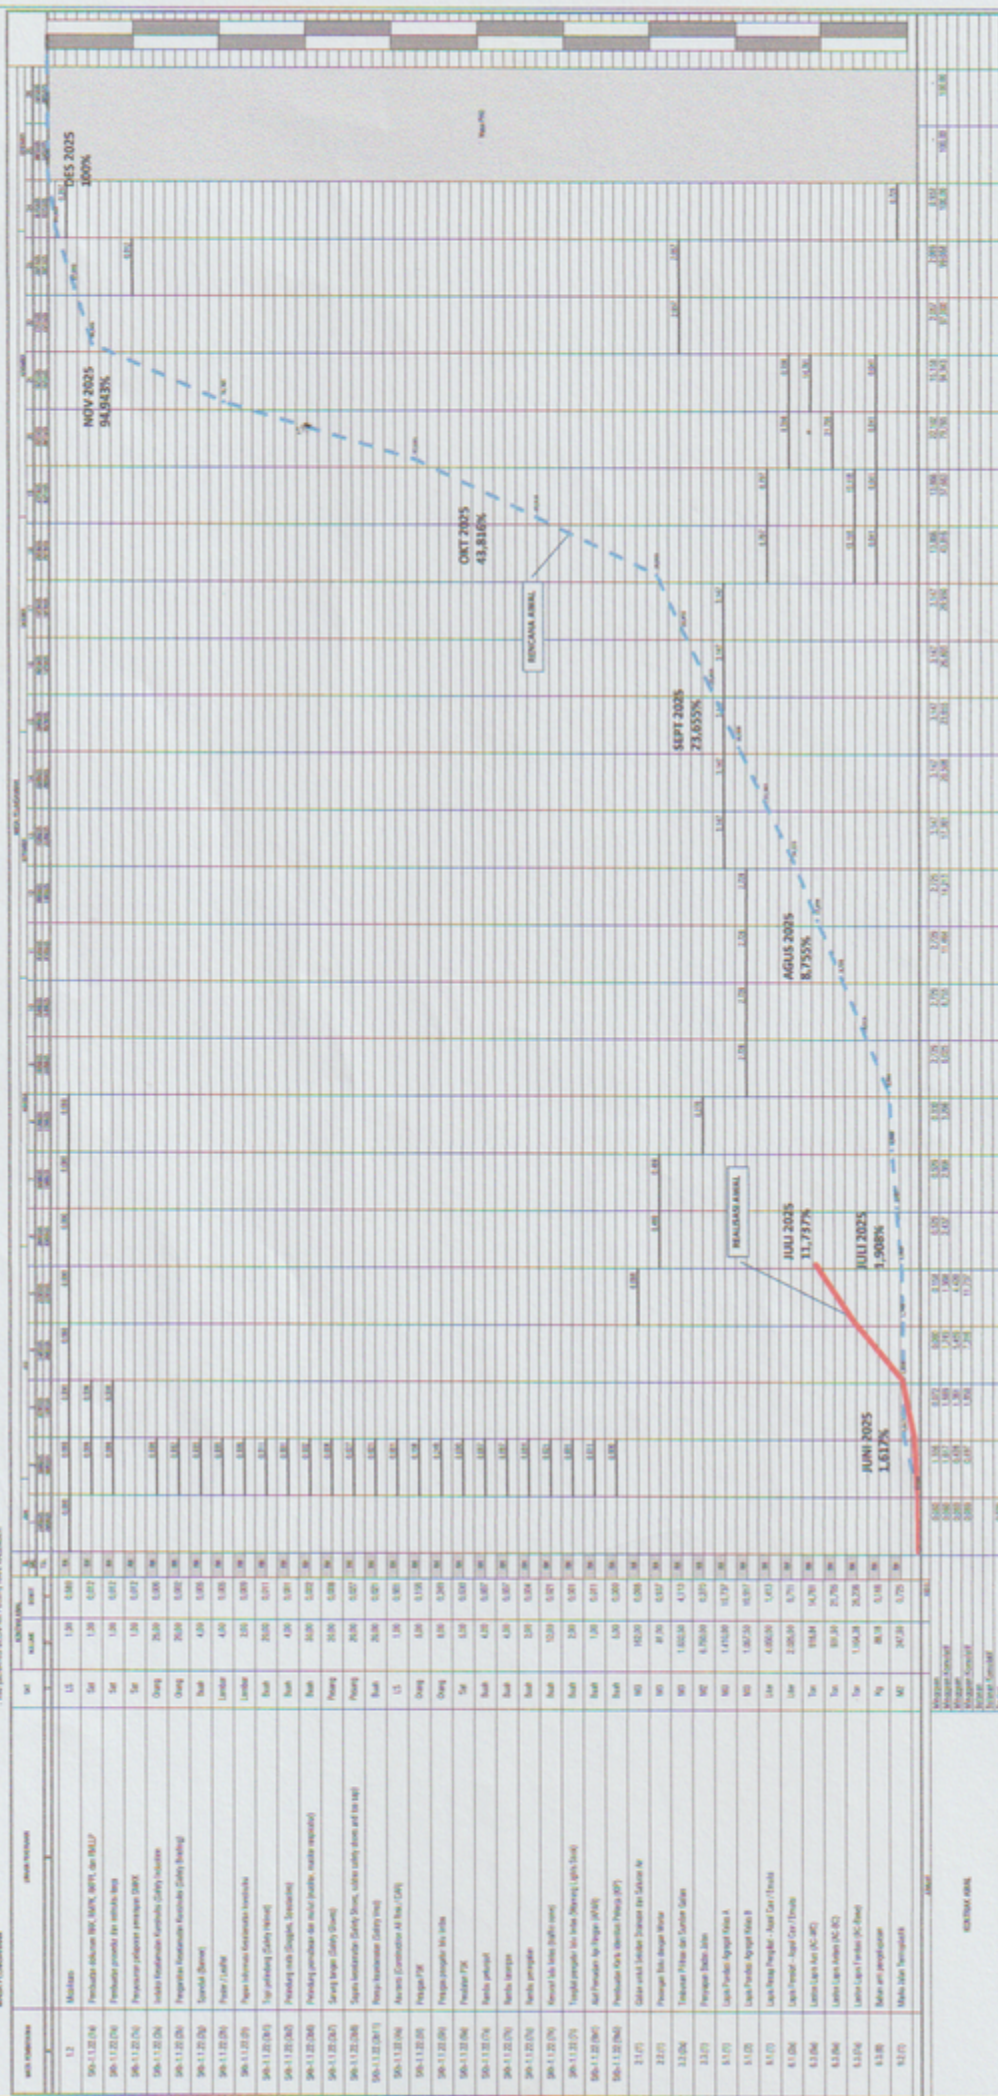

 EKA PRAYITNO, ST
 Pelaksana Proyek

JULIAN SIMP, MANCHESTER - SUMNER HOLLING - ALAN HENNINGSON, WENTWORTH (2001 SUMMIT)

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

14000-1-10-2 1523.9729494 6.204720225
24 June 2025

THESE VIEWS
ARE NOT
NECESSARILY
THOSE OF THE
FEDERAL RESERVE



Downloaded by:
THE HONG KONG MARITIME UNIVERSITY
129.13.254.110 - 12/11/2015 11:05:40 AM

Disetujui oleh:
Manajemen Superintenden

Disusun oleh:
Persada Jaka,
KURNIA TITIA ARAZI

30.11.2010. 57
Peraturan Perundang-undangan

LAPORAN BULANAN


Paket Pekerjaan : Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak (DBH Sawit)

Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Merangia
No. Kontrak : T-600.2.10.2_15/JLN/DPUPR-5.2/VI/2025
Tanggal Kontrak : 24 Juni 2024
Konsultan Supervisi : PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI
Penyedia Jasa : CV. NIRWANA TIRTA ABADI

Bulan : Juni 2025
Periode : 24 Juni 2025 s/d 30 Juni 2025

NO. ITEM PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN					% TERHADAP	
			KONTRAK AWAL	BOBOT (%)	S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	ITEM PEKERJAAN	SELURUH PEKERJAAN
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)			
DIVISI 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	0,689	-	-	0,10	0,069	0,10	10,00	0,069
SKh-1.1.22 (1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPP, dan RMLLP	Set	1,00	0,012	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	0,012	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMK	Set	1,00	0,012	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	25,00	0,006	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	20,00	0,002	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (2g)	Spanduk (Banner)	Buah	4,00	0,005	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (2h)	Poster / Leaflet	Lembar	4,00	0,005	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (2i)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Lembar	2,00	0,009	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	20,00	0,011	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	4,00	0,001	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (3b6)	Pelindung pematasan dan mulut (masker, masker respirator)	Buah	50,00	0,002	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	20,00	0,008	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	20,00	0,027	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	20,00	0,021	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (4a)	Asuransi (Construction All Risk / CAR)	LS	1,00	0,901	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (5f)	Petugas P3K	Orang	5,00	0,156	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	8,00	0,249	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (6a)	Peralatan P3K	Set	5,00	0,030	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (7a)	Rambu petunjuk	Buah	4,00	0,007	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (7b)	Rambu larangan	Buah	4,00	0,007	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	0,004	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	12,00	0,021	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,00	0,001	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	0,011	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22 (9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	5,00	0,000	-	-	-	-	-	-	-
DIVISI 2	DRAINASE										
2.1 (1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	162,00	0,098	-	-	-	-	-	-	-
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	81,00	0,937	-	-	-	-	-	-	-
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK										
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	1.633,50	4,113	-	-	-	-	-	-	-
3.3 (1)	Penyulap Badan Jalan	M2	6.750,00	0,270	-	-	-	-	-	-	-
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN										
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.410,00	15,737	-	-	-	-	-	-	-
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.057,50	10,917	-	-	-	-	-	-	-
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	4.050,00	1,413	-	-	-	-	-	-	-
6.1 (2a)	Lapis Perikat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	2.025,00	0,711	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	618,84	14,761	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	931,50	21,705	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.164,38	26,236	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	88,18	0,166	-	-	-	-	-	-	-
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN										
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	247,50	0,725	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BOBOT				100,0	REALISASI %	-	REALISASI %	0,069	REALISASI %	0,069	
					RENCANA %	-	RENCANA %	0,060	RENCANA %	0,060	
					DEVIASI %	-	DEVIASI %	0,009	DEVIASI %	0,009	


Diperiksa/Ditetujui oleh,
PPK Bidang Bina Marga Sub Kegiatan Pembangunan Jalan


WAHYU HIDAYAT, ST
NIP. 19780821 201212 1 001

Diperiksa oleh,
Konsultan Supervisi
PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI


EKA PRAYITNO, ST
Supervision Engineer

Diajukan oleh,
Penyedia Jasa
CV. NIRWANA TIRTA ABADI


EKA PRAYITNO, ST
Pelaksana Proyek

TAYLOR FRANCIS 2025



1

Sh:

TE. VECCHIAROLA DUTTA MANENTI

CV. NIMBA TREDA 4

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN
RAKYAT PROVINSI JAMBI
BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN BULANAN
PERIODE 5 – PERIODE 7**

**SUB KEGIATAN :
PEMBANGUNAN JALAN**

**PAKET PEKERJAAN :
JALAN SIMP. MARGOYOSO - SUMBER AGUNG - AIR HITAM/SIMP.
MENTAWAK (DBH SAWIT)**

**NOMOR KONTRAK
TANGGAL KONTRAK
ADDENDUM-01
SUMBER DANA
PENYEDIA JASA
KONSULTAN**

**: T-600.2.10.2_15/JLN/DPUPR-5.2/VI/2025
: 24 JUNI 2025
: 19 AGUSTUS 2025
: DBH SAWIT PROVINSI JAMBI
: CV. NIRWANA TIRTA ABADI
: PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI**

LAPORAN BULANAN

Paket Pekerjaan : Jalan Simp. Margeyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Montawak (DBH Sawit)
 Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Merangin
 No. Kontrak : T-600.2.10.2.15/JLN/DPUPR-5.2/VI/2025
 Tanggal Kontrak : 24 Juni 2024
 Addendum-01 : 19 Agustus 2025
 Final Addendum : 01 Desember 2025
 Konsultan Supervisi : PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI
 Penyedia Jasa : CV. NIRWANA TIRTA ABADI

Bulan : Desember 2025
 Periode : 01 Desember 2025 s/d 07 Desember 2025

NO. ITEM PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK				KEMAJUAN PEKERJAAN					% TERHADAP	
			KONTRAK AWAL	ADD-01	FINAL ADD	BOBOT (%)	S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	ITEM PEKERJAAN	SELURUH PEKERJAAN
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME		
DIVISI 1	UMUM												
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	1,00	0,689	0,70	0,482	0,30	0,207	1,00	100,00	0,689
SKh-1.1.22.1(a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPL dan RMLLP	Set	1,00	1,00	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	100,00	0,012
SKh-1.1.22.1(b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	1,00	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	100,00	0,012
SKh-1.1.22.1(c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMK	Set	1,00	1,00	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	1,00	100,00	0,012
SKh-1.1.22.2(a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	25,00	25,00	25,00	0,006	25,00	0,006	-	-	25,00	100,00	0,006
SKh-1.1.22.2(b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	20,00	20,00	20,00	0,002	20,00	0,002	-	-	20,00	100,00	0,002
SKh-1.1.22.2(c)	Spanduk (Banner)	Buah	4,00	4,00	4,00	0,005	4,00	0,005	-	-	4,00	100,00	0,005
SKh-1.1.22.2(d)	Poster / Leaflet	Lembar	4,00	4,00	4,00	0,005	4,00	0,005	-	-	4,00	100,00	0,005
SKh-1.1.22.2(e)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Lembar	2,00	2,00	2,00	0,009	2,00	0,009	-	-	2,00	100,00	0,009
SKh-1.1.22.3(a)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	20,00	20,00	20,00	0,011	20,00	0,011	-	-	20,00	100,00	0,011
SKh-1.1.22.3(b)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	4,00	4,00	4,00	0,001	4,00	0,001	-	-	4,00	100,00	0,001
SKh-1.1.22.3(c)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Buah	50,00	50,00	50,00	0,002	50,00	0,002	-	-	50,00	100,00	0,002
SKh-1.1.22.3(d)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	20,00	20,00	20,00	0,008	20,00	0,008	-	-	20,00	100,00	0,008
SKh-1.1.22.3(e)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	20,00	20,00	20,00	0,027	20,00	0,027	-	-	20,00	100,00	0,027
SKh-1.1.22.3(f)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	20,00	20,00	20,00	0,021	20,00	0,021	-	-	20,00	100,00	0,021
SKh-1.1.22.4(a)	Asuransi (Construction All Risk / CAR)	LS	1,00	1,00	1,00	0,901	1,00	0,901	-	-	1,00	100,00	0,901
SKh-1.1.22.5(a)	Petugas P3K	Orang	5,00	5,00	5,00	0,156	5,00	0,125	1,00	0,031	5,00	100,00	0,156
SKh-1.1.22.5(b)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	8,00	8,00	8,00	0,249	8,00	0,187	2,00	0,062	8,00	100,00	0,249
SKh-1.1.22.6(a)	Peralatan P3K	Set	5,00	5,00	5,00	0,030	5,00	0,030	-	-	5,00	100,00	0,030
SKh-1.1.22.7(a)	Rambu petunjuk	Buah	4,00	4,00	4,00	0,007	4,00	0,007	-	-	4,00	100,00	0,007
SKh-1.1.22.7(b)	Rambu larangan	Buah	4,00	4,00	4,00	0,007	4,00	0,007	-	-	4,00	100,00	0,007
SKh-1.1.22.7(c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	2,00	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	100,00	0,004
SKh-1.1.22.7(d)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	12,00	12,00	12,00	0,021	12,00	0,021	-	-	12,00	100,00	0,021
SKh-1.1.22.7(e)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,00	2,00	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	100,00	0,001
SKh-1.1.22.8(a)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	1,00	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	100,00	0,011
SKh-1.1.22.9(a)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	5,00	5,00	5,00	0,000	5,00	0,000	-	-	5,00	100,00	0,000
DIVISI 2	DRAINASE												
2.1.1	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	162,00	134,36	134,36	0,081	134,36	0,081	-	-	134,36	100,00	0,081
2.2.1	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	81,00	78,20	105,27	1,218	78,20	0,905	27,07	0,313	105,27	100,00	1,218
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.2.2(a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	1.633,50	1.381,05	1.356,84	3,417	1.356,84	3,417	0,00	0,000	1.356,84	100,00	3,417
3.3.1	Penyiapan Badan Jalan	M2	6.750,00	10.543,50	10.543,50	0,422	10.543,50	0,422	-	-	10.543,50	100,00	0,422
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.410,00	1.395,90	1.395,90	15,580	1.395,90	15,580	-	-	1.395,90	100,00	15,580
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.057,50	1.136,02	1.136,02	11,728	1.136,02	11,728	-	-	1.136,02	100,00	11,728
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL												
6.1.1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	4.050,00	6.489,45	6.489,45	2,265	6.489,45	2,265	-	-	6.489,45	100,00	2,265
6.1.2	Lapis Perak - Aspal Cair / Emulsi	Liter	2.025,00	2.004,76	2.004,76	0,704	2.004,76	0,704	-	-	2.004,76	100,00	0,704
6.3.5(a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	618,84	606,68	604,90	14,429	604,90	14,429	-	-	604,90	100,00	14,429
6.3.5(b)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	931,50	911,64	905,95	21,110	905,95	21,110	-	-	905,95	100,00	21,110
6.3.7(a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.164,38	1.167,95	1.164,52	28,239	1.164,52	28,239	-	-	1.164,52	100,00	28,239
6.3.8	Bahan anti pengelupasan	Kg	88,18	84,94	84,94	0,160	84,94	0,160	-	-	84,94	100,00	0,160
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN												
9.2.1	Marka Jalan Termoplastik	M2	247,50	149,88	149,88	0,439	-	-	149,88	0,439	149,88	100,00	0,439
JUMLAH BOBOT						100,0	REALISASI %	98,936	REALISASI %	1,064	REALISASI %	100,00	100,00
							RENCANA %	1,968	RENCANA %	99,032	RENCANA %	100,00	100,00
							DEVIASI %	97,828	DEVIASI %	(97,828)	DEVIASI %	-	-

Diperiksa/Ditandatangani oleh,
 PPK Bidang Bina Marga Sub Kegiatan Pembangunan Jalan


WARYU HIDAYAT, ST
 NIP. 197808212012121 1 001

Diperiksa oleh,
 Konsultan Supervisi
 PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI


Ir. ERWIN
 Supervision Engineer

Diajukan oleh,
 Penyedia Jasa
 CV. NIRWANA TIRTA ABADI


EKA PRAYITNO, ST
 Pelaksana Proyek


LAPORAN BULANAN

Paket Pekerjaan : Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak (DBH Sawit)
 Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Merangin
 No. Kontrak : T-600.2.10.2.15/JLN/DPUPR-5.2/VI/2025
 Tanggal Kontrak : 24 Juni 2024
 Addendum-01 : 19 Agustus 2025
 Konsultan Supervisi : PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI
 Penyedia Jasa : CV. NIRWANA TIRTA ABADI

Bulan : November 2025
 Periode : 01 November 2025 s/d 30 November 2025

NO. ITEM PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK			KEMAJUAN PEKERJAAN				% TERHADAP		
			KONTRAK AWAL	ADD-01	BOBOT (%)	S/D BULAN LALU VOLUME	BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	ITEM PEKERJAAN N	SELURUH PEKERJAAN N
DIVISI 1	UMUM											
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	0,689	0,70	0,482	-	-	0,70	70,00	0,482
SKH-1.1.22.1(a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPP, dan RMLLP	Set	1,00	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	100,00	0,012
SKH-1.1.22.1(b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	100,00	0,012
SKH-1.1.22.1(c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMK	Set	1,00	1,00	0,012	-	-	-	-	-	-	-
SKH-1.1.22.2(a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	25,00	25,00	0,006	25,00	0,006	-	-	25,00	100,00	0,006
SKH-1.1.22.2(b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	20,00	20,00	0,002	20,00	0,002	-	-	20,00	100,00	0,002
SKH-1.1.22.2(g)	Spenduk (Banner)	Buah	4,00	4,00	0,005	4,00	0,005	-	-	4,00	100,00	0,005
SKH-1.1.22.2(h)	Poster / Leaflet	Lembar	4,00	4,00	0,005	4,00	0,005	-	-	4,00	100,00	0,005
SKH-1.1.22.2(i)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Lembar	2,00	2,00	0,009	2,00	0,009	-	-	2,00	100,00	0,009
SKH-1.1.22.3(a)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	20,00	20,00	0,011	20,00	0,011	-	-	20,00	100,00	0,011
SKH-1.1.22.3(b)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	4,00	4,00	0,001	4,00	0,001	-	-	4,00	100,00	0,001
SKH-1.1.22.3(c)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Buah	50,00	50,00	0,002	50,00	0,002	-	-	50,00	100,00	0,002
SKH-1.1.22.3(d)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	20,00	20,00	0,008	20,00	0,008	-	-	20,00	100,00	0,008
SKH-1.1.22.3(e)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	20,00	20,00	0,027	20,00	0,027	-	-	20,00	100,00	0,027
SKH-1.1.22.3(f)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	20,00	20,00	0,021	20,00	0,021	-	-	20,00	100,00	0,021
SKH-1.1.22.4(a)	Asuransi (Construction All Risk / CAR)	LS	1,00	1,00	0,901	1,00	0,901	-	-	1,00	100,00	0,901
SKH-1.1.22.5(a)	Petugas P3K	Orang	5,00	5,00	0,156	4,00	0,125	-	-	4,00	80,00	0,125
SKH-1.1.22.5(b)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	8,00	8,00	0,249	6,00	0,187	-	-	6,00	75,00	0,187
SKH-1.1.22.5(c)	Peralatan P3K	Set	5,00	5,00	0,030	5,00	0,030	-	-	5,00	100,00	0,030
SKH-1.1.22.7(a)	Rambu petunjuk	Buah	4,00	4,00	0,007	4,00	0,007	-	-	4,00	100,00	0,007
SKH-1.1.22.7(b)	Rambu larangan	Buah	4,00	4,00	0,007	4,00	0,007	-	-	4,00	100,00	0,007
SKH-1.1.22.7(c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	100,00	0,004
SKH-1.1.22.7(d)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	12,00	12,00	0,021	12,00	0,021	-	-	12,00	100,00	0,021
SKH-1.1.22.7(e)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,00	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	100,00	0,001
SKH-1.1.22.9(a)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	100,00	0,011
SKH-1.1.22.9(b)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	5,00	5,00	0,000	5,00	0,000	-	-	5,00	100,00	0,000
DIVISI 2	DRAINASE											
2.1.1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	162,00	134,36	0,081	134,36	0,081	-	-	134,36	100,00	0,081
2.2.1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	81,00	78,20	0,905	5,30	0,061	72,90	0,844	78,20	100,00	0,905
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK											
3.2.2(a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	1.633,50	1.381,05	3,478	1.356,84	3,417	-	-	1.356,84	98,25	3,417
3.3.1)	Penyilangan Badan Jalan	M2	6.750,00	10.543,50	0,422	10.543,50	0,422	-	-	10.543,50	100,00	0,422
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN											
5.1.1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.410,00	1.395,90	15,580	1.395,90	15,580	-	-	1.395,90	100,00	15,580
5.1.2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.057,50	1.136,02	11,728	1.136,02	11,728	-	-	1.136,02	100,00	11,728
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL											
6.1.1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	4.050,00	5.489,45	2,265	5.489,45	2,265	-	-	5.489,45	100,00	2,265
6.1.2a)	Lapis Persekat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	2.025,00	2.004,76	0,704	2.004,76	0,704	-	-	2.004,76	100,00	0,704
6.3.5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	618,84	606,68	14,471	604,90	14,429	-	-	604,90	99,71	14,429
6.3.6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	931,50	911,84	21,242	905,95	21,110	-	-	905,95	99,38	21,110
6.3.7a)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	Ton	1.164,38	1.167,95	26,316	1.164,52	26,239	-	-	1.164,52	99,71	26,239
6.3.8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	88,18	84,94	0,180	84,94	0,180	-	-	84,94	100,00	0,180
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELINHAHAN											
9.2.1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	247,50	149,88	0,436	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BOBOT					100,0	REALISASI %	98,992	REALISASI %	0,844	REALISASI %	98,936	
						RENCANA %	98,288	RENCANA %	11,083	RENCANA %	99,342	
						DEVIASI %	9,812	DEVIASI %	(10,219)	DEVIASI %	(0,407)	


Diperiksa/Ditandatangani oleh,
 PPK Bidang Bina Marga Sub Kegiatan Pembangunan Jalan


 WAHYU HIDAYAT, ST
 NIP. 19780821 201212 1 001

Diperiksa oleh,
 Konsultan Supervisi
 PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI


 Ir. ERWIN
 Supervision Engineer

Ditajukan oleh,
 Penyedia Jasa
 CV. NIRWANA TIRTA ABADI


 EKA PRAYITNO, ST
 Pelaksana Proyek

LAPORAN BULANAN

Paket Pekerjaan : Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mostawak (DBH Sawit)
 Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Merangin
 No. Kontrak : T-600.2.10.2_15/JLN/DPUPR-5.2/VI/2025
 Tanggal Kontrak : 24 Juni 2024
 Addendum-01 : 19 Agustus 2025
 Konsultan Supervisi : PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI
 Penyedia Jasa : CV. NIRWANA TIRTA ABADI

Bulan : Oktober 2025
 Periode : 01 Oktober 2025 s/d 31 Oktober 2025

NO. ITEM PEMBAAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK			KEMAJUAN PEKERJAAN				% TERHADAP	
			KONTRAK AWAL	ADD-01	BOBOT (%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	ITEM PEKERJAAN	SELURUH PEKERJAAN	
						VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	
DIVISI 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	0,689	0,70	0,482	-	-	0,70	70,00
SKb-1.1.22 (1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPL dan RMLLP	Set	1,00	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	100,00
SKb-1.1.22 (1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	100,00
SKb-1.1.22 (1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMK	Set	1,00	1,00	0,012	-	-	-	-	-	-
SKb-1.1.22 (2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	25,00	25,00	0,006	25,00	0,006	-	-	25,00	100,00
SKb-1.1.22 (2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	20,00	20,00	0,002	20,00	0,002	-	-	20,00	100,00
SKb-1.1.22 (2g)	Spanduk (Banner)	Buah	4,00	4,00	0,005	4,00	0,005	-	-	4,00	100,00
SKb-1.1.22 (2h)	Poster / Leaflet	Lembar	4,00	4,00	0,005	4,00	0,005	-	-	4,00	100,00
SKb-1.1.22 (2i)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Lembar	2,00	2,00	0,009	2,00	0,009	-	-	2,00	100,00
SKb-1.1.22 (3a1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	20,00	20,00	0,011	20,00	0,011	-	-	20,00	100,00
SKb-1.1.22 (3a2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	4,00	4,00	0,001	4,00	0,001	-	-	4,00	100,00
SKb-1.1.22 (3a6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Buah	50,00	50,00	0,002	50,00	0,002	-	-	50,00	100,00
SKb-1.1.22 (3a7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	20,00	20,00	0,008	20,00	0,008	-	-	20,00	100,00
SKb-1.1.22 (3a8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	20,00	20,00	0,027	20,00	0,027	-	-	20,00	100,00
SKb-1.1.22 (3a11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	20,00	20,00	0,021	20,00	0,021	-	-	20,00	100,00
SKb-1.1.22 (4a)	Asuransi (Construction All Risk / CAR)	LS	1,00	1,00	0,901	1,00	0,901	-	-	1,00	100,00
SKb-1.1.22 (5a)	Petugas P3K	Orang	5,00	5,00	0,156	4,00	0,125	-	-	4,00	80,00
SKb-1.1.22 (5b)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	8,00	8,00	0,249	6,00	0,187	-	-	6,00	75,00
SKb-1.1.22 (5a)	Peralatan P3K	Set	5,00	5,00	0,030	5,00	0,030	-	-	5,00	100,00
SKb-1.1.22 (7a)	Rambu petunjuk	Buah	4,00	4,00	0,007	4,00	0,007	-	-	4,00	100,00
SKb-1.1.22 (7b)	Rambu larangan	Buah	4,00	4,00	0,007	4,00	0,007	-	-	4,00	100,00
SKb-1.1.22 (7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	100,00
SKb-1.1.22 (7d)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	12,00	12,00	0,021	12,00	0,021	-	-	12,00	100,00
SKb-1.1.22 (7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,00	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	100,00
SKb-1.1.22 (9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	100,00
SKb-1.1.22 (9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	5,00	5,00	0,000	5,00	0,000	-	-	5,00	100,00
DIVISI 2	DRAINASE										
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	162,00	134,36	0,081	134,36	0,081	-	-	134,36	100,00
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	81,00	78,20	0,305	-	-	5,30	0,061	5,30	6,78
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK										
3.2 (2a)	Timbunan Pijihan dari Sumber Galian	M3	1.833,50	1.381,05	3,478	150,00	0,378	1.205,84	3,039	1.356,84	98,75
3.3 (1)	Penyapian Badan Jalan	M2	6.750,00	10.543,50	0,422	10.543,50	0,422	-	-	10.543,50	100,00
DIVISI 5	PEKERJAAN BERBUTIR DAN PEKERJAAN BETON SEMEN										
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.410,00	1.395,90	15,580	1.395,90	15,580	-	-	1.395,90	100,00
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.057,50	1.136,02	11,728	1.136,02	11,728	-	-	1.136,02	100,00
DIVISI 6	PEKERJAAN ASPAL										
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	4.050,00	6.489,45	2,265	6.489,45	2,265	-	-	6.489,45	100,00
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	2.025,00	2.004,76	0,704	1.939,82	0,681	85,14	0,023	2.004,76	100,00
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	618,84	606,68	14,471	584,84	13,950	20,06	0,479	604,90	99,71
6.3 (5b)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	931,50	911,64	21,242	905,95	21,110	-	-	905,95	99,38
6.3 (7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.164,38	1.167,95	26,316	1.164,52	26,239	-	-	1.164,52	99,71
6.3 (8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	88,18	84,94	0,160	81,88	0,154	3,06	0,005	84,94	100,00
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN										
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	247,50	149,88	0,439	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BOBOT					100,0	REALISASI %	94,485	REALISASI %	3,607	REALISASI %	98,092
						RENCANA %	46,836	RENCANA %	42,244	RENCANA %	86,298
						DEVIASI %	48,449	DEVIASI %	(38,637)	DEVIASI %	9,812

Diperiksa/Ditetujui oleh,
 PPK Bidang Bina Marga Sub Kegiatan Pembangunan Jalan

WAKTU HIDAYAT, ST
 NIP. 19780821 201212 1 001

Diperiksa oleh,
 Konsultan Supervisi
 PT. MEDIATAMA DUTA MANDIRI

IL. ERWIN
 Supervision Engineer

Diajukan oleh,
 Penyedia Jasa
 CV. NIRWANA TIRTA ABADI

EKA PRAYITNO, ST
 Pelaksana Proyek

ALAN TAYLOR, MANAGER, GENERAL INVESTMENTS, NEW YORK CITY (NY)

1-800-333-3333 WWW.MAGNETIC.COM

The figure is a topographic map of a study area. It features a grid with coordinates ranging from 100 to 1000 on the horizontal axis and 100 to 1000 on the vertical axis. The map shows contour lines representing elevation, with labels such as 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, and 1000. Several points of interest are marked with labels: 'BANGKALAN ADD-01', 'BANGKALAN ADD-02', and 'BANGKALAN ADD-03'. The 'BANGKALAN RIVER' is also labeled. The map includes a scale bar at the bottom left, indicating distances in meters (0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000). A north arrow is located at the bottom right. The map is titled 'PETA TOPOGRAFI DAERAH STUDI' at the top left.

David J. Isakiah,
 1000 W. 10th St., Suite 100, Anchorage, Alaska 99501-4300

Copyright © 2004
Kluwer Academic Publishers
All rights reserved.

Qualquer coisa,
Parece a obra,
Cé. sempre a vida, a vida.

www.pearsoned.com
 Publishing Program
